



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 11

1. Zakończono demontaż starego poszycia na wysokim dachu, trwa montaż nowego poszycia







2 Kontynuacja prac brukarskich



3 Trwające prace ziemne i przygotowania pod prace brukarskie przy osi 14



4. Wykuwanie starego fundamentu oraz przygotowywanie materiału do wykonania przekruszu



5. Wylewanie nowej posadzki




6 Demontaż starych jednostek dachowych, przygotowywanie nowego systemu wentylacji



7 Rozpoczynanie prac związanych z nowym poszyciem ścian



8. Rozpoczęcie płytowania ścian międzylokalowych

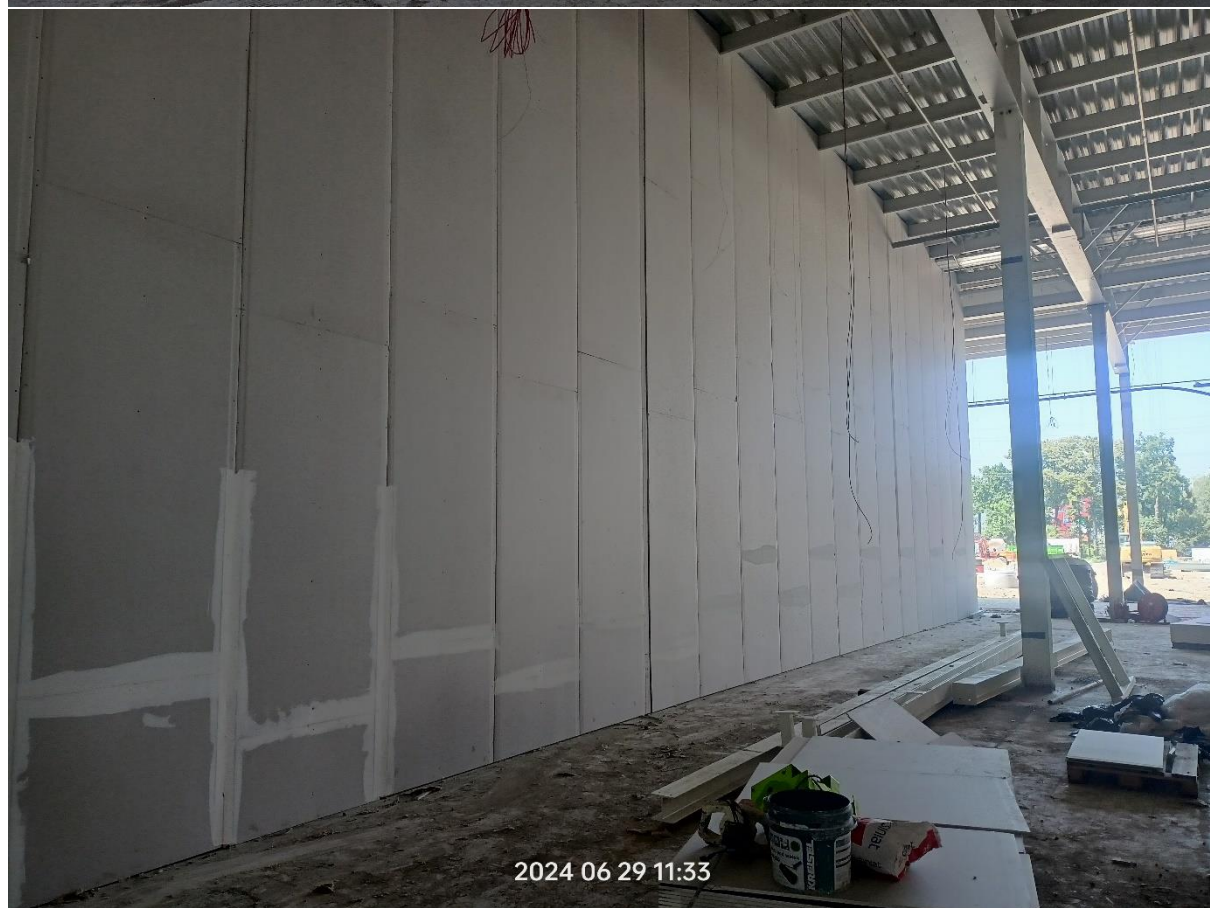

9 Wykuwanie posadzek m.in. pod chłodnię i mroźnię



10. Zakończono prace fundamentowe pod Burger Kinga



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Wykonanie przekruszu oraz rozpoczęcie prac związanych ze stabilizacją terenu w osi C3-K
2. Rozpoczęcie montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Kontynuacja prac związanych z montażem stolarki aluminiowej
4. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buerger king
5. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
6. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
7. Kontynuacja prac brukarskich
8. Wykonywanie nowych posadzek w lokalu Media Expert
9. Kontynuacja wykonywania nowego poszycia dachowego.
10. Rozpoczęcie murowania ściany ogniowej w osi K`
11. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
12. Kontynuacja prac związane z nowymi ścianami (ściany przy płytach warstwowych) .
13. Kontynuacja kucia oraz wykonywanie nowych posadzek oraz fundamentów głównie w rejonie Kaufland
14. Zakończenie montażu światłowodu
