



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 15

1. Zakończono prace związane z wykonywaniem poszycia dachu, dalsza część prac obejmuje wykończenie krawędzi attyki





2 Trwają prace brukarskie



3 Trwa wygradzanie lokali najemców w zabudowie GK




4. Wycinanie otworów pod stolarkę okienno-drzwiową



5. Montaż nowych posadzek oraz uzupełnienie otworów po pracach posadzkowych zanikowych



6.Montaż Fasad oraz płyt warstwowych

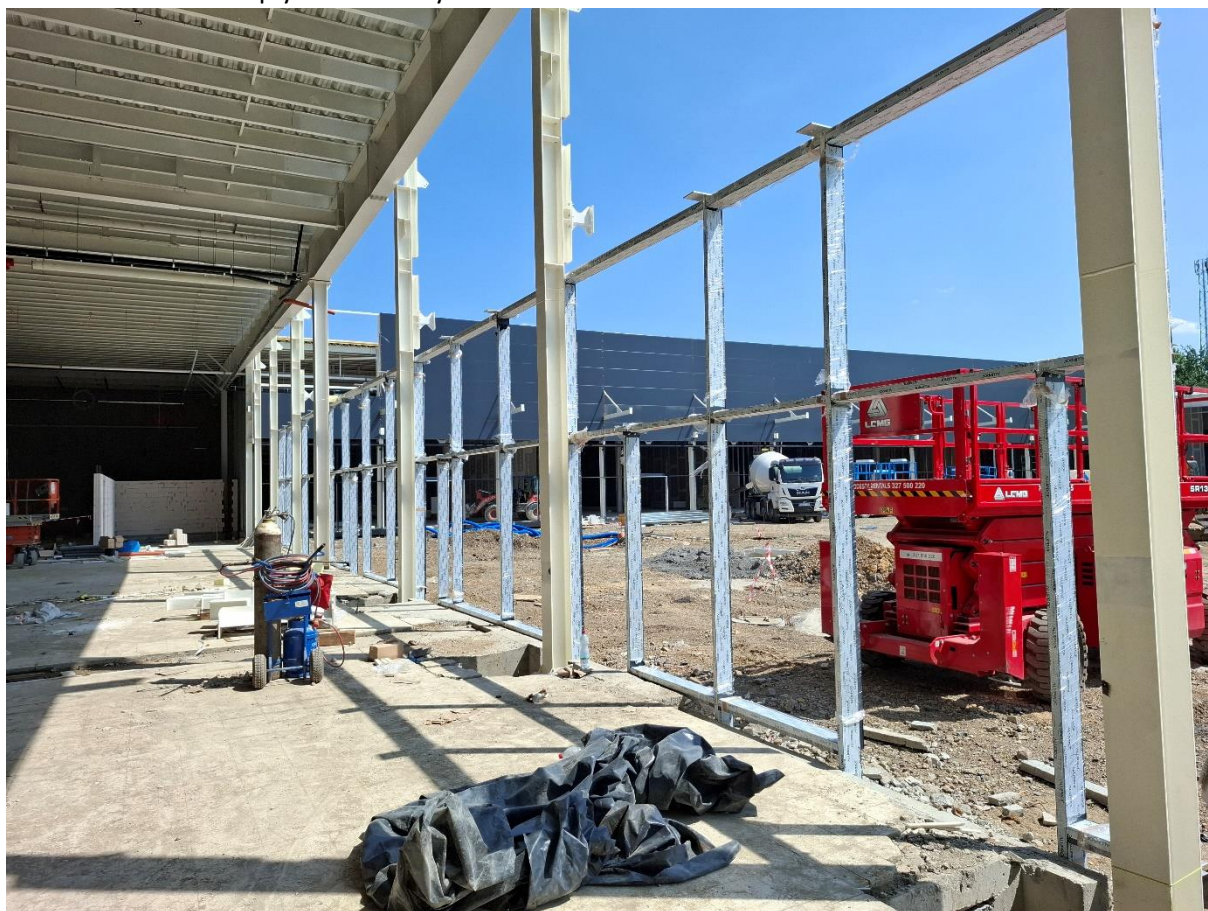

7. Przygotowanie stolarki okiennej i drzwiowej pod montaż



8. Wykonywanie stabilizacji pod płyte etap II



PLAN NA PRZYSZŁY TYDZIEŃ:

1. Kontynuacja wykonywania stabilizacji na placu

2. Kontynuacja montażu nowych kanałów wentylacyjnych
3. Kontynuacja prac murarskich w rejonie Buergerking oraz sciany pomiędzy etapem I i II
4. Wykonywanie płyty posadzki na Burger King
5. Kontynuacja osadzania słupów stalowych oraz drugorzędnej konstrukcji stalowej
6. Kontynuacja montażu systemu tryskaczy
7. Kontynuacja prac brukarskich
8. Kontynuacja wykonywania poszycia attyk
9. Kontynuacja płytowania ścian między lokalowych
10. Kontynuacja murowania ścian na powierzchni Kaufland
11. Zamknięcie szczelności lokalu Jysk Extreame sport oraz Woolworth
12. Rozpoczęcie szklenia fasad aluminiowych
13. Kontynuacja kucia oraz wykonywanie nowych posadzek oraz fundamentów głównie w rejonie Kaufland
