



RAPORT POSTĘPU PRAC nr 22

1. Widok inwestycji i z lotu ptaka



2. Prace przy demontażu pylonu



3. Widok całości inwestycji wraz z lokalem Burger King




4. Widok na dach etap II trawają prace nad poszyciem dachu



5. Dach lokalu Burger King, montaż muru oporowego wzdłuż Drive-thru



6 Prace glazurnicze na lokalu Maxi ZOO

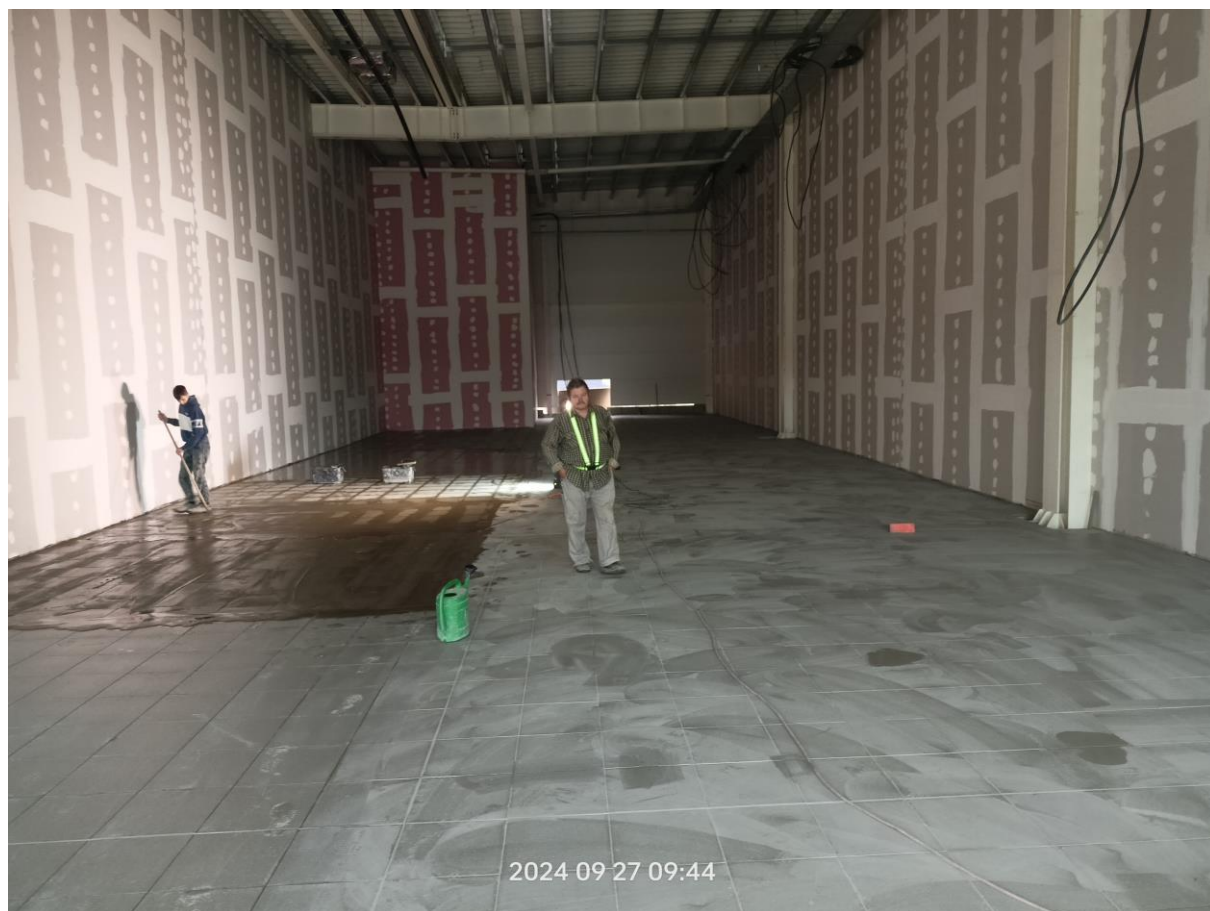

Tydzień 23.09-28.09.2024r.

Przekazanie Lokalu Verona

Przekazanie Lokalu La Flor

Plan na Tydzień 30.09-05.10.2024r

1. Zakończenie montażu membrany etap II
- 2 Kontynuacja prac brukarskich
- 3 Zakończenie prac związanych z montażem płyt warstwowych.
- 5 Wykonanie prac związanych z przekładką linii średniego napięcia wzdłuż osi 14
6. Przekazywanie kolejnych lokali według harmonogramu
