
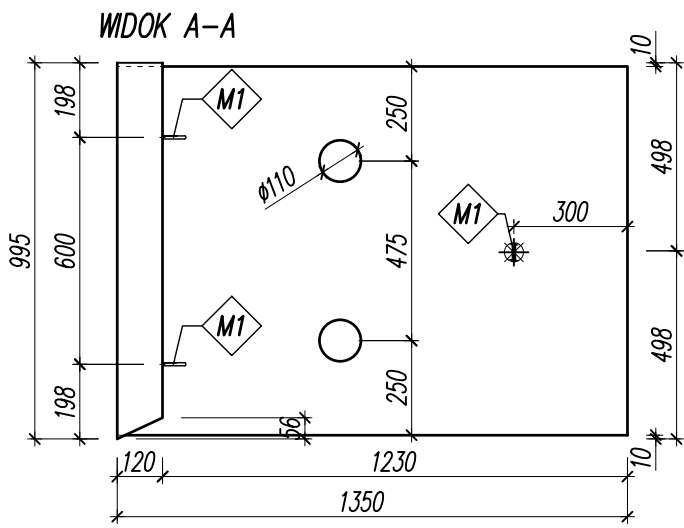
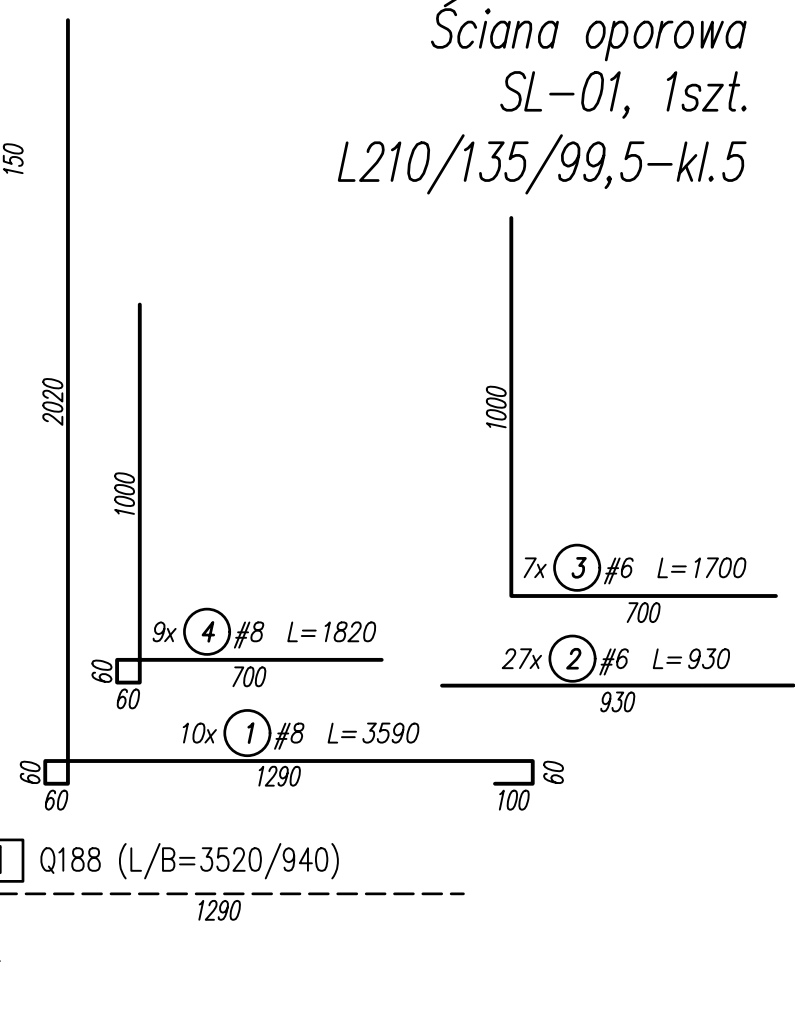
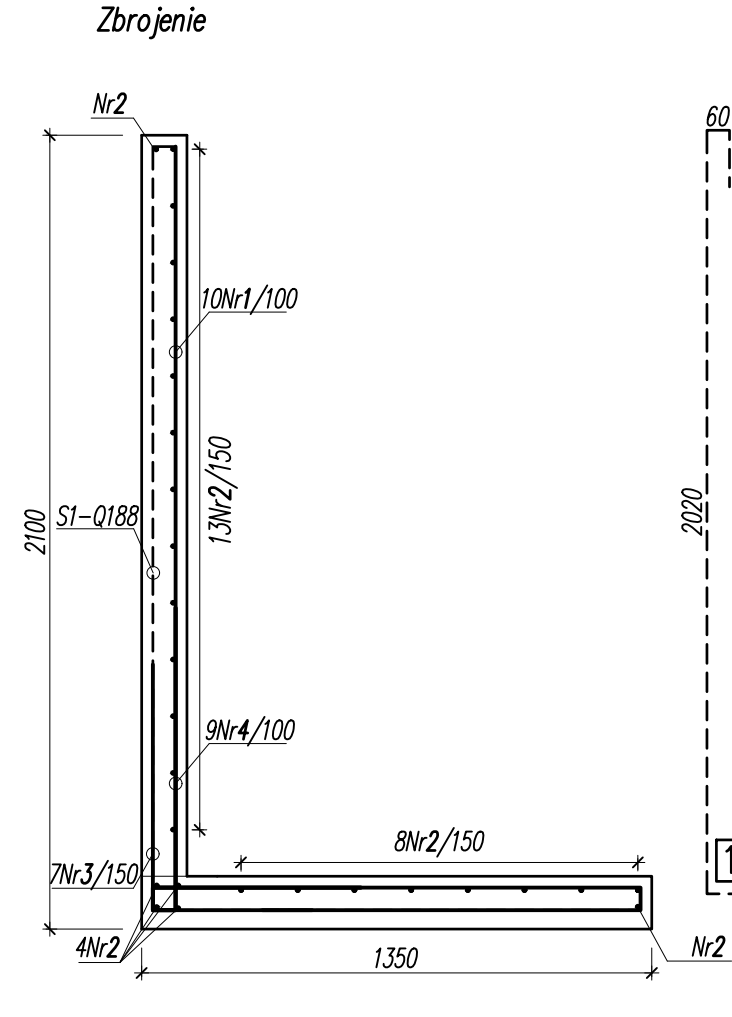
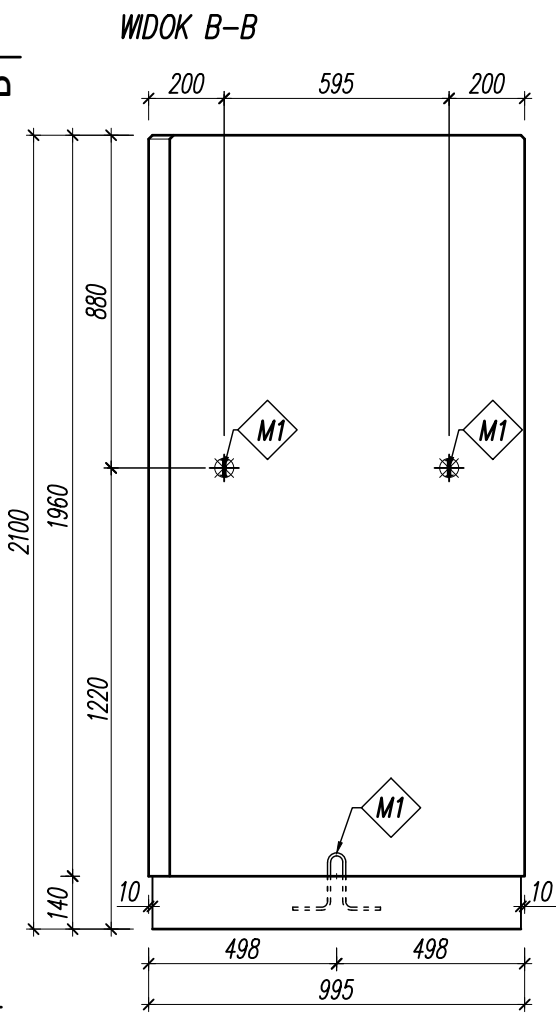


C:\Users\jychanski\Desktop\BET0590_24 - DALDEHOG - Bielsko Biala\BET0590_24 - Daldehog - Bielsko Biala.dwg, SL-01, 2024-07-29 13:41:37, ISO full bleed A3 (420.00 x 297.00 mm)

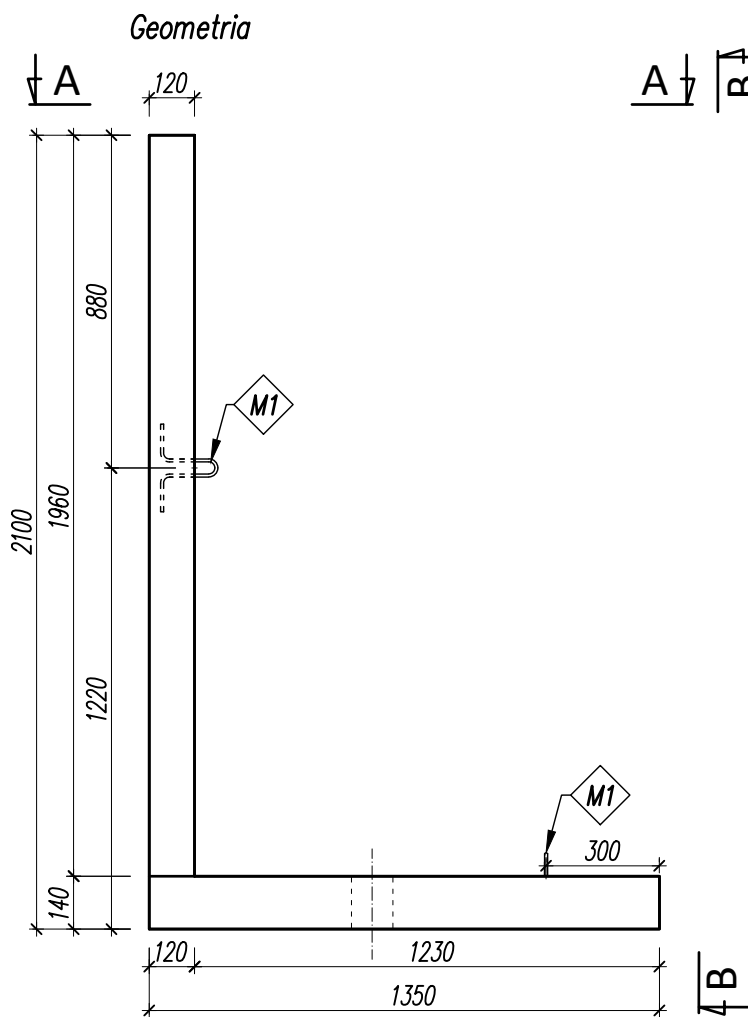


ZESTAWIENIE AKCESORIÓW DO WBUDOWANIA W PREFABRYKAT

Poz.	szt./el.	Opis elementu
M1	3	Pętla ze stali A-I Ø8mm


- UWAGI:**
- Pręty wymiarowane po krawędziach zewnętrznych.
 - Haki montażowe dobrać zgodnie z zaleceniami producenta. Haki do obrotu i rozszalowania wg wytycznych kierownika produkcji
 - Dopuszczalne zwężenie podstawy max. 10mm na stronę.

BETON: C30/37 W8 F150
STAL: A-IIIN (RB 500)
OTULINY: 30mm, 50mm od spodu stopy
OBJĘTOŚĆ BETONU: 0,425 m³/1mb
MASA ELEMENTU: 1060 kg /1mb
KLASA OBCIĄŻENIA: 5

Schemat fazowania

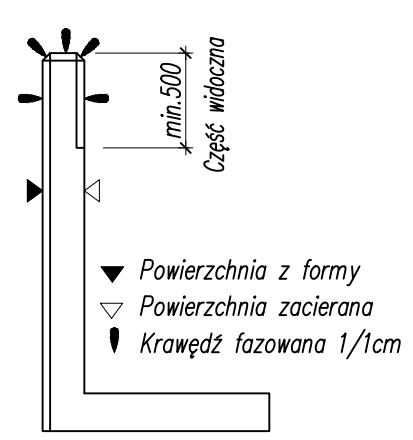

Schemat podnoszenia

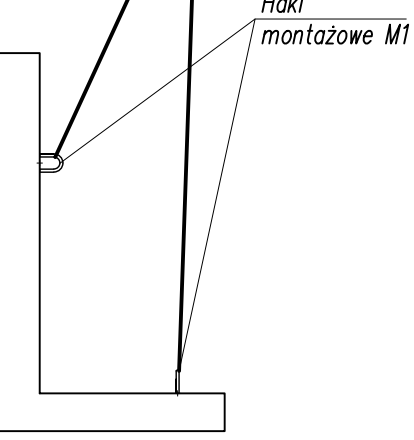

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
Element	Nr pręta	# / f	Gat. stali	Ilość [szt]	Długość [mm]	A-IIIIN - łączna długość [m]			
						6	8	10	12
SL-01 L210/135/99,5	1	8	A-IIIIN	10	3 590	-----	35.90	-----	-----
	2	6	A-IIIIN	27	930	25.11	-----	-----	-----
	3	6	A-IIIIN	7	1 700	11.90	-----	-----	-----
	4	8	A-IIIIN	10	1 820	-----	18.20	-----	-----
Długość łączna					[m]	37.01	54.10	0.00	0.00
Masa jednostkowa					[kg/m]	0.222	0.395	0.617	0.889
Masa łączna prętów					[kg]	8.22	21.37	0.00	0.00
						29.6			
SIATKI ZBROJENIOWE									
Nr siatki		Długość [mm]		Szerokość [mm]		pole	m. jedn.	ilość	masa
		[mm]		[mm]		[m2]	[kg/m2]	[szt.]	[kg]
S1	188	3520		940		3.31	3.01	1	9.96
Masa łączna siatek					[kg]	10.0			
Razem stal zbrojeniowa w elemencie					[kg]	39.6			

WYKONAWCA PROJEKTU:		BETARD	Pracownia Projektowa Firmy BETARD Długoleka, ul. Polna 30 tel.: 071 315 20 09	
Tytuł rysunku: pełny	Ściana oporowa SL-01		Tytuł rysunku:	SL - 01
